

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO DO DIQUE 3

AVANÇO FÍSICO

O relatório que se apresenta tem o recorte do período de 26/05/2022 a 26/07/2022.

O avanço físico da obra de descaracterização do Dique 3 atingiu 58%, mantendo-se aderente ao avanço planejado para o período.

MARCO	PREVISTO	TENDENCIA
Limpeza e Lastro de Conquista	15/04/2022	✓ 15/04/2022
Aterro de Descaracterização	06/05/2022	✓ 06/05/2022
Escavação do Reservatório e Dique	17/10/2022	13/10/2022
Canais de Drenagem	02/11/2022	28/10/2022
Desmobilização	30/12/2022	30/12/2022

Tabela 1 – Marcos cronograma Descaracterização Dique 3, corte julho/22. Fonte: Vale, 2022.

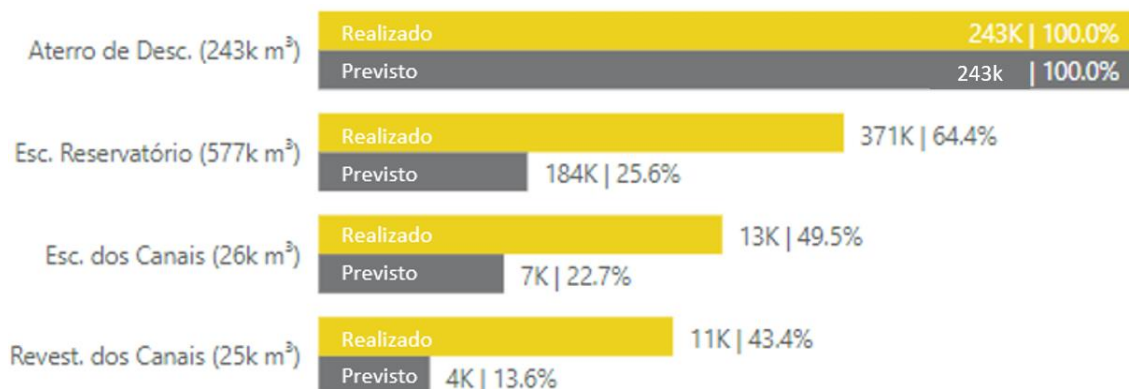


Figura 1 – Avanço da remoção de rejeitos na descaracterização, corte julho/22. Fonte: Vale, 2022.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Até a presente data, está em andamento a escavação do reservatório e dique com avanço de 64%, sendo 371mil m³ dos 577mil m³ totais previstos. A escavação dos



canais de drenagem totalizou 13mil m³ dos 26mil m³ totais previstos e o revestimento dos canais com 11mil m³ dos 25mil m³ totais previstos.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 2 – Vista de Montante para jusante. Data de corte: julho/2022.



Figura 3 – Vista de Jusante para montante. Data de corte: julho/2022.
