

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM VARGEM GRANDE

AVANÇO FÍSICO

O relatório que se apresenta tem o recorte do período de 26/05/2022 a 26/07/2022.

O avanço físico da obra de descaracterização da barragem Vargem Grande atingiu 9%, mantendo-se aderente ao avanço planejado para o período e a previsão final da descaracterização.

MARCO	PREVISTO	TENDÊNCIA
Conclusão da remoção do 3º alteamento	01/05/2026	01/05/2026
Conclusão da remoção do 2º alteamento	31/12/2026	31/12/2026
Conclusão da remoção do 1º alteamento	28/10/2027	28/10/2027
Término da obra de Descaracterização	29/10/2027	29/10/2027

Tabela 1 – Marcos cronograma Descaracterização da Barragem de Vargem Grande. Fonte: Vale, 2022.

CRONOGRAMA

O planejamento inicial da descaracterização da Barragem de Vargem Grande, foi desenvolvido considerando a existência de variáveis e possibilidades de atraso relacionadas a utilização dos equipamentos, grau de risco da estrutura e proximidade com as comunidades vizinhas. Neste cenário, o prazo para conclusão da descaracterização foi estimado em outubro/2027.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Até a presente data, estão em andamento as obras de descaracterização que abrange o Projeto de Melhoria da Estabilização da Barragem - Área 1 Fase 2, com a escavação no reservatório com avanço de 96%, sendo 471.000 m³ realizado dos 490.000 m³ previstos.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

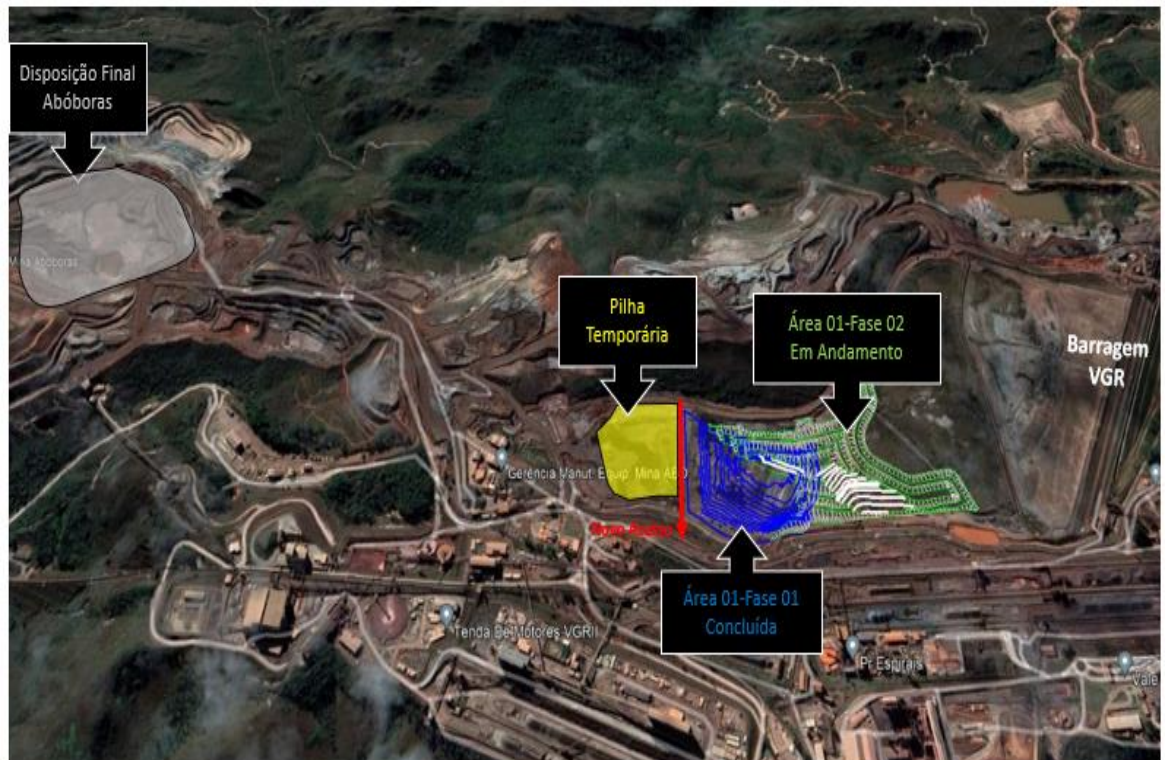


Figura 1 – Vista dos projetos das obras de melhorias na estrutura



Figura 2 – Visão Geral da escavação Área 1 Fase 2(25/07/2022)



Figura 3 – Execução dos lastros para acesso ao reservatório (25/07/2022)



Figura 4 – Marcações topográficas do off set final do projeto (25/07/2022)
