

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM CAMPO GRANDE

AVANÇO FÍSICO

O relatório que se apresenta tem o recorte do período de 26/05/2022 a 26/07/2022.

O avanço físico da obra de descaracterização da barragem Campo Grande atingiu 7%, mantendo-se aderente ao avanço planejado para o período.

Tabela 1 – Marcos cronograma Descaracterização. Fonte: Vale, 2022.

MARCO	PREVISTO	TENDÊNCIA
Serviços preliminares para reforço (<i>Early Works</i>)	Abr/23	Abr/23 ●
Reforço do Maciço Principal e Diques	Dez/26	Dez/26 ●
Canais de drenagem do reservatório (<i>regreide</i>)	Dez/26	Dez/26 ●

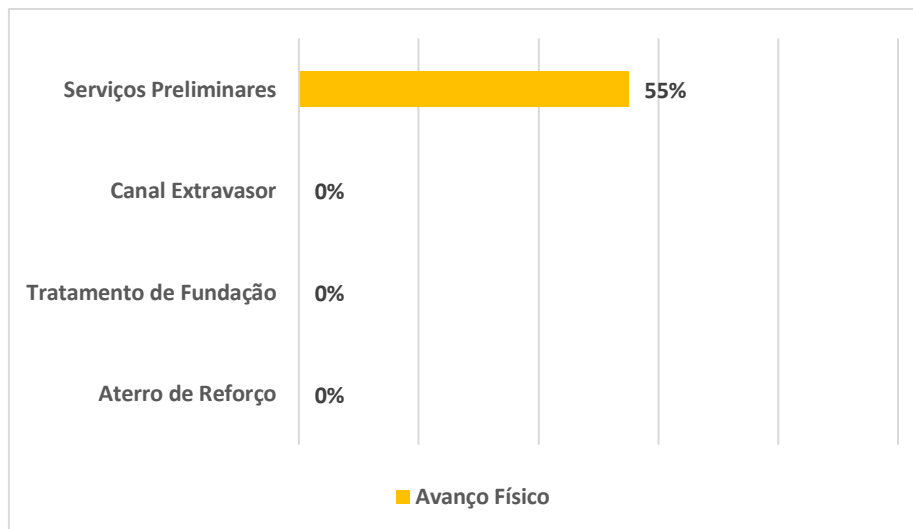


Figura 1 – Avanço das principais etapas de descaracterização. Fonte: Vale, 2022.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

A seguir apresenta-se uma síntese das principais atividades realizadas no período, por etapa do projeto de descaracterização.

Serviços preliminares para reforço (Early Works):

- Construção de canteiro definitivo para obras de descaracterização
- Execução de aterro experimental com estéril
- Execução da instrumentação pré-obra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 2 - Barragem Campo Grande: Construção de canteiro de obras (22/07/2022)



Figura 3 - Barragem Campo Grande: Aterro experimental (22/07/2022)



Figura 4 - Barragem Campo Grande: Investigações geotécnicas para projeto detalhado (22/07/2022)



Figura 5 - Barragem Campo Grande: Instalação rede microssísmica (22/07/2022)
