

ANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM CAMPO GRANDE

AVANÇO FÍSICO

O relatório que se apresenta tem o recorte do período de Agosto/2022 a Outubro/2022.

O avanço físico das atividades de descaracterização da barragem Campo Grande atingiu 7,5%, mantendo-se aderente ao avanço planejado para o período.

Tabela 1 – Marcos cronograma Descaracterização. Fonte: Vale, 2022.

MARCO	PREVISTO	TENDÊNCIA
Serviços preliminares para reforço (<i>Early Works</i>)	Abr/23	Abr/23 ●
Reforço do Maciço Principal e Diques	Dez/26	Dez/26 ●
Canais de drenagem do reservatório (<i>regreide</i>)	Dez/26	Dez/26 ●

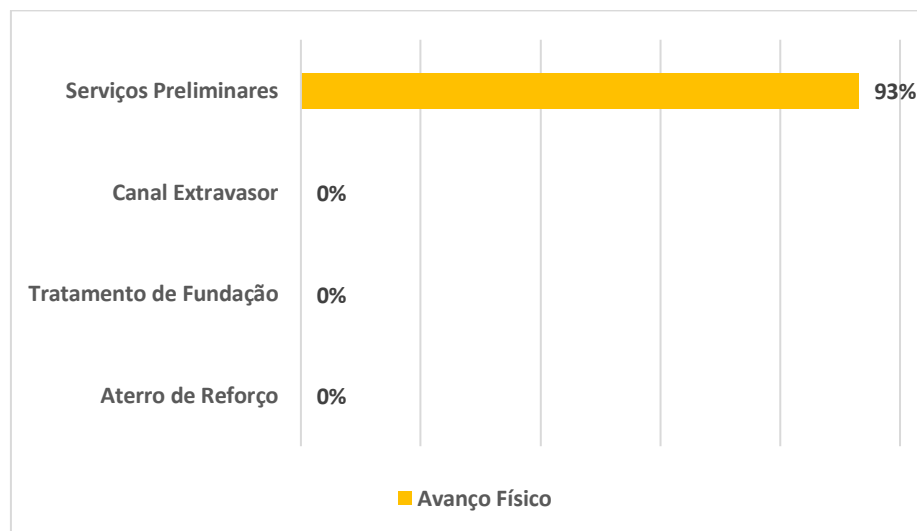


Figura 1 – Avanço das principais etapas de descaracterização. Fonte: Vale, 2022.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

A seguir, apresenta-se uma síntese das principais atividades realizadas no período, por etapa do projeto de descaracterização.

Serviços preliminares para reforço (Early Works):

- Conclusão do aterro experimental com estéril
- Conclusão da instalação da instrumentação pré-obra de tratamento de fundação
- Comissionamento da instrumentação pré-obra (em andamento)
- Construção de canteiro definitivo para obras de descaracterização (em andamento)
- Execução de sondagens complementares e ensaios de laboratório (em andamento)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 2 - Barragem Campo Grande: Construção de canteiro de obras (26/10/2022)



Figura 3 - Barragem Campo Grande: Instalação de placas solares para canteiro (26/10/2022)



Figura 4 - Barragem Campo Grande: Investigações geotécnicas para projeto detalhado (26/10/2022)
